

飯田市代替地整備に伴う トンネル発生土の活用について

第10回松川町リニア中央新幹線建設工事対策委員会
令和2年6月26日(金)

飯田市 リニア推進部

1

飯田市代替地整備造成土運搬について

◆運搬時期

- 当初：令和2年3月～令和2年9月（月曜日～土曜日及び祝日）
- 変更：令和2年5月～令和3年1月（月曜日～土曜日及び祝日）
- 日曜日、お盆、年末年始等の長期休暇は運搬を休止します。
また、地元行事が開催される場合等は運搬について調整します。

◆延長理由

- 小渋川河川内道路供用開始後の5月から運搬開始としたため、当初の予定より2ヶ月半遅れで運搬開始とした。
- 土砂の比重が当初の想定より重く、1台当りの積載量が減となり、運搬台数が増加となっている。
- 通勤通学時間帯に配慮した運搬を行っており、1日の運搬台数を減便して運搬を行っている。

◆運搬時間帯：8時30分～17時00分まで（変更なし）

◆運搬台数：1日最大で片道100台（変更なし）



2

運搬スケジュールについて

● 飯田市代替地整備運搬スケジュール

	令和2年											令和3年
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
当初	[Orange bar from Mar to Sep]											
1日当り最大運搬台数(片道)	100	100	100	100	100	100	100					
変更			[Blue bar from May to Dec]									
1日当り最大運搬台数(片道)			30	45~80	100	100	100	100	100	80	60	

● 飯田市・喬木村運搬スケジュール

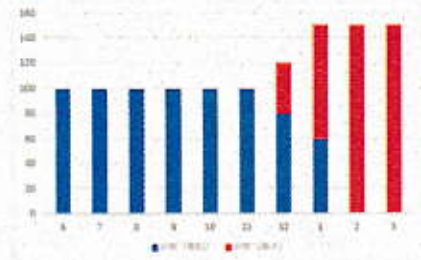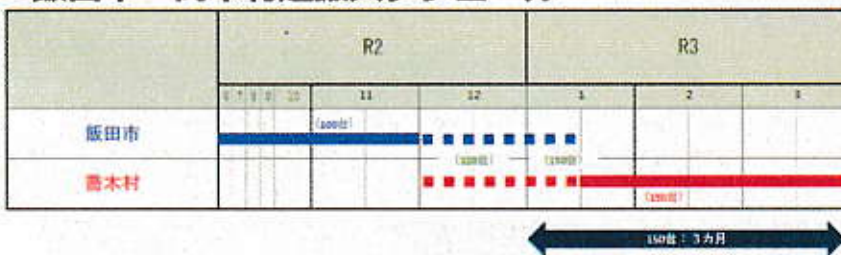

3

お問合せ先について

- 運搬車両の運転席と荷台にこの様な表示を行い運搬しています。
- ご迷惑をお掛けした場合には、番号をご連絡頂ければ早急に対応致します。



● お問合せ・連絡先

飯田市 リニア推進部 リニア用地課 代替地整備係
 担当：課長 小倉 担当 小池
 電話：0265-22-4543 (直通)

4
